


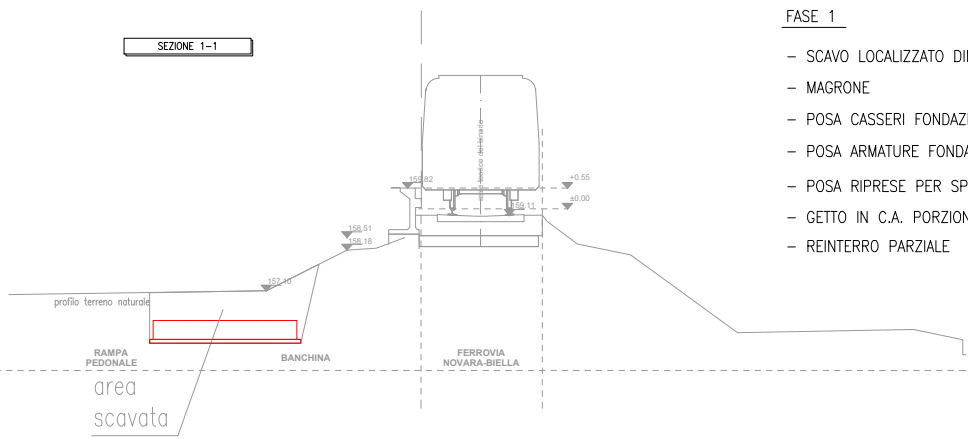
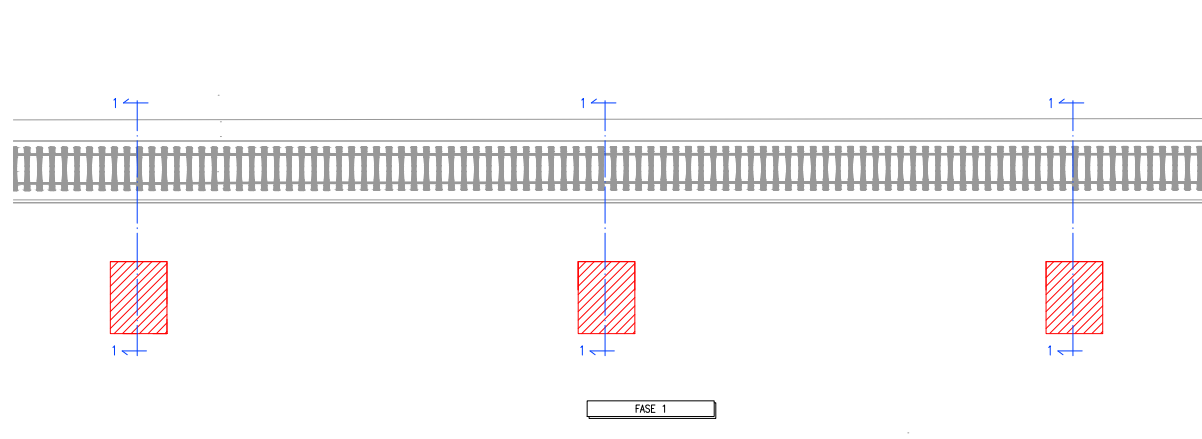
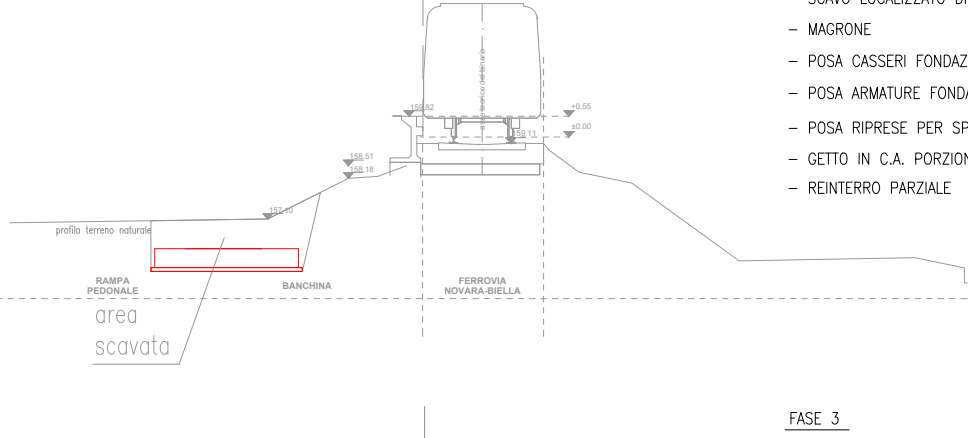


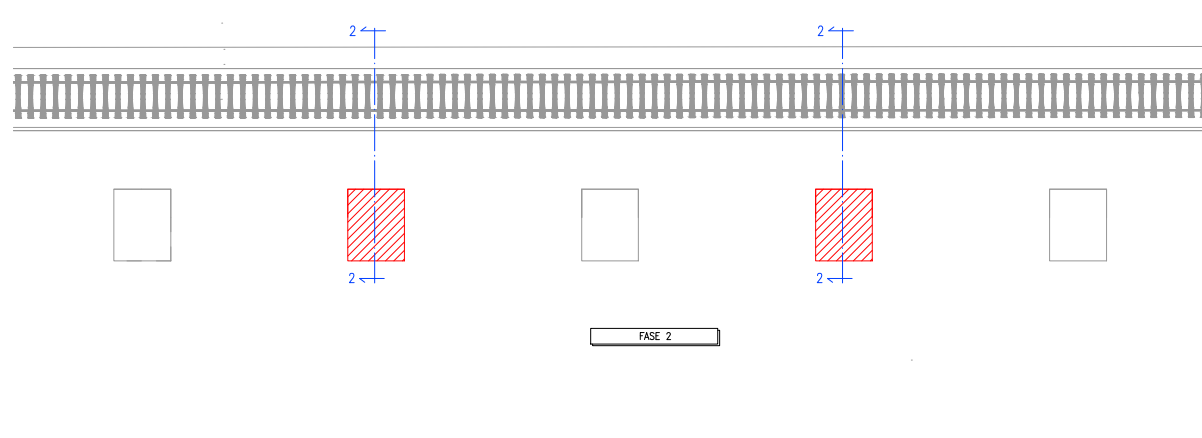



- FASE 1
- SCAVO LOCALIZZATO DIMENSIONI 300x380x138 hmax
 - MAGRONE
 - POSA CASSERI FONDAZIONI
 - POSA ARMATURE FONDAZIONI GIA' ASSEMBLATE
 - POSA RIPRESE PER SPERONI
 - GETTO IN C.A. PORZIONE FONDAZIONI
 - REINTERRO PARZIALE

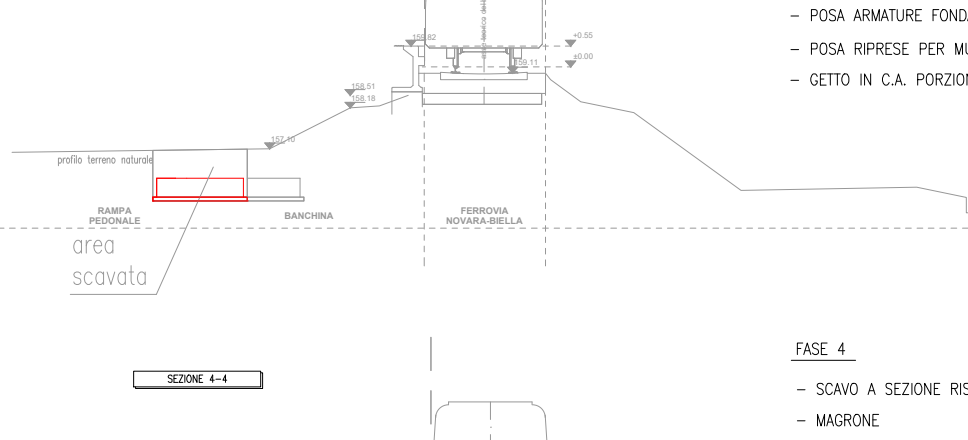



- FASE 2
- SCAVO LOCALIZZATO DIMENSIONI 300x380x138 hmax
 - MAGRONE
 - POSA CASSERI FONDAZIONI
 - POSA ARMATURE FONDAZIONI GIA' ASSEMBLATE
 - POSA RIPRESE PER SPERONI
 - GETTO IN C.A. PORZIONE FONDAZIONI
 - REINTERRO PARZIALE

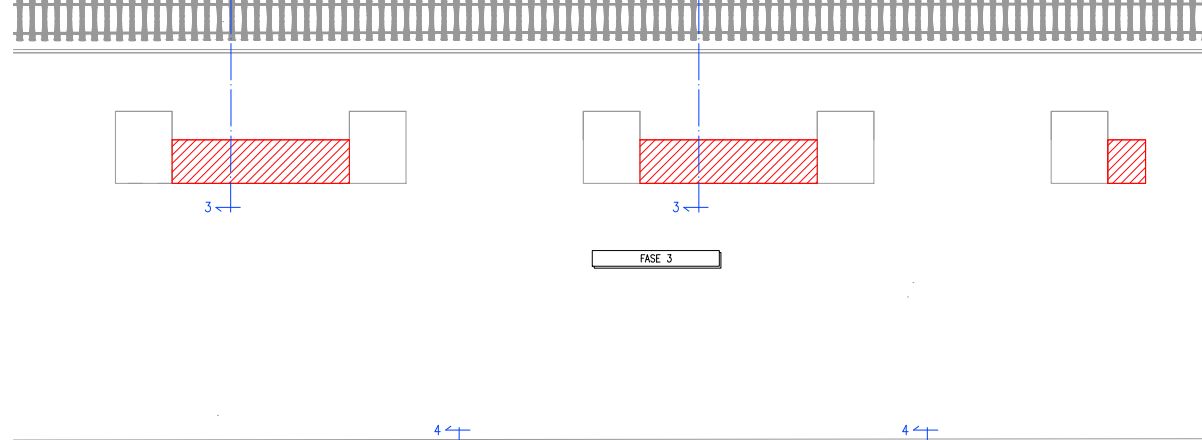



- FASE 3
- SCAVO PER FONDAZIONE CONTINUA
 - MAGRONE
 - POSA CASSERI FONDAZIONI
 - POSA ARMATURE FONDAZIONI GIA' ASSEMBLATE
 - POSA RIPRESE PER MURI
 - GETTO IN C.A. PORZIONE FONDAZIONI

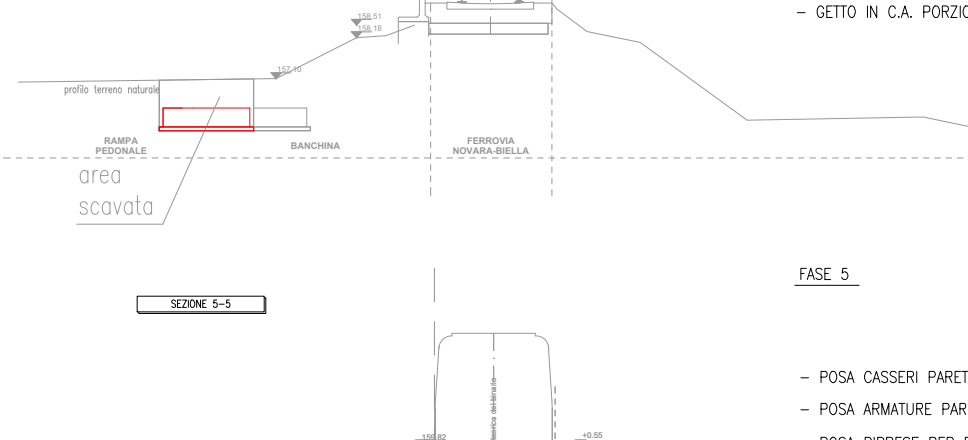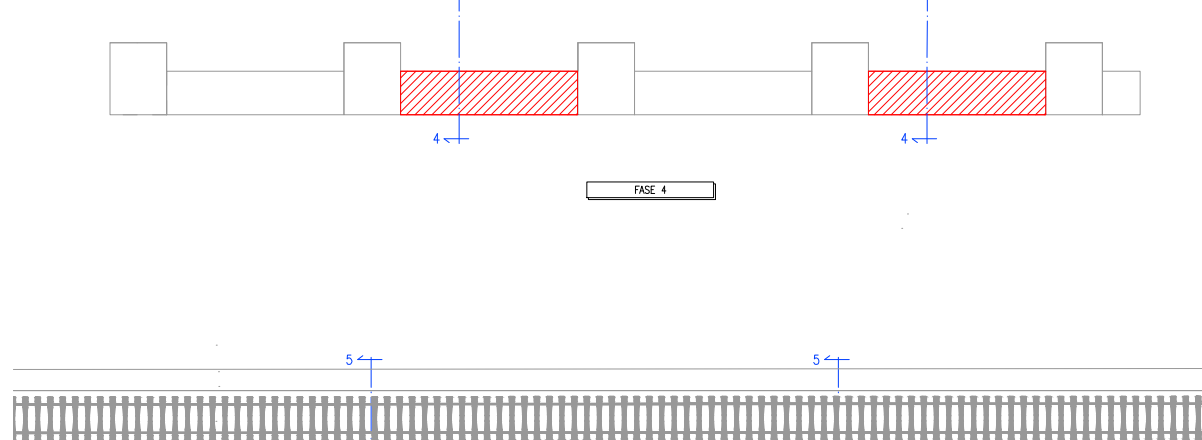

- FASE 4
- SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER FONDAZIONE
 - MAGRONE
 - POSA CASSERI FONDAZIONI
 - POSA ARMATURE FONDAZIONI GIA' ASSEMBLATE
 - POSA RIPRESE PER MURI
 - GETTO IN C.A. PORZIONE FONDAZIONI

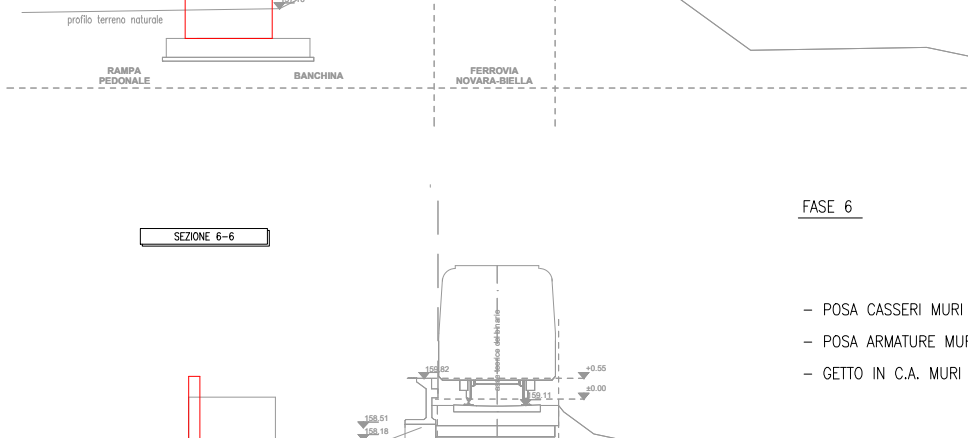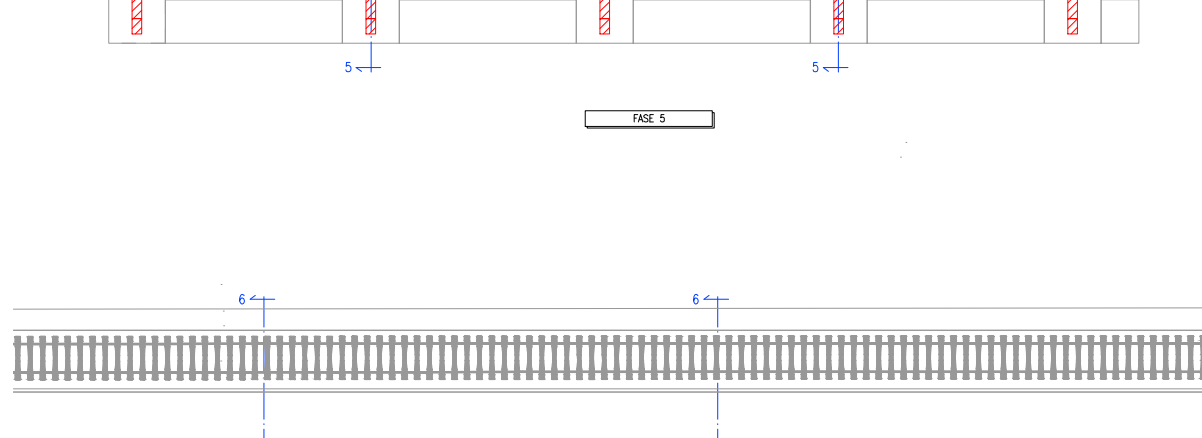



- FASE 5
- POSA CASSERI PARETI/SPERONI IN C.A.
 - POSA ARMATURE PARETI/SPERONI GIA' ASSEMBLATE
 - POSA RIPRESE PER PLASTRI SUPERIORI
 - GETTO IN C.A. PARETI/SPERONI

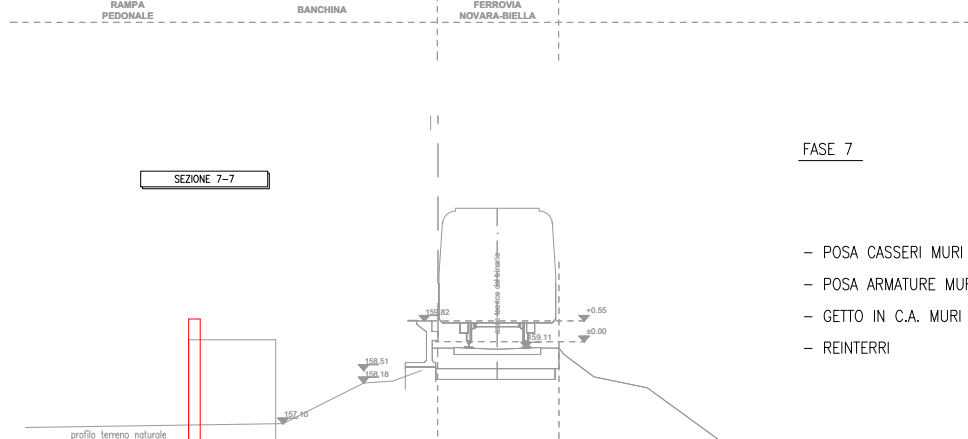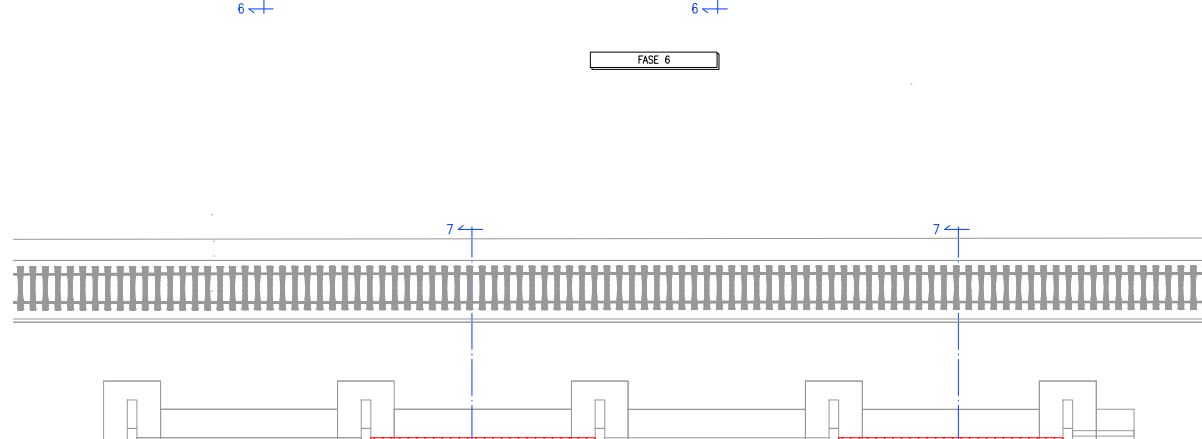



- FASE 6
- POSA CASSERI MURI IN C.A.
 - POSA ARMATURE MURI GIA' ASSEMBLATE
 - GETTO IN C.A. MURI





- FASE 7
- POSA CASSERI MURI IN C.A.
 - POSA ARMATURE MURI GIA' ASSEMBLATE
 - GETTO IN C.A. MURI
 - REINTERRI

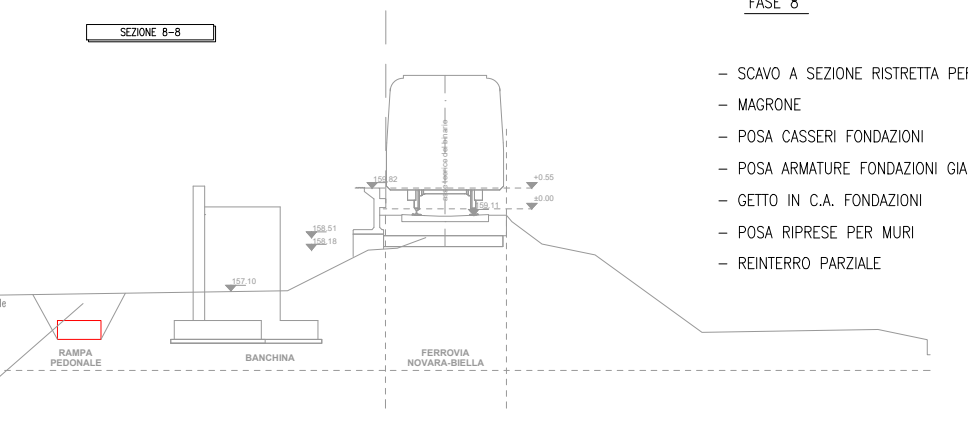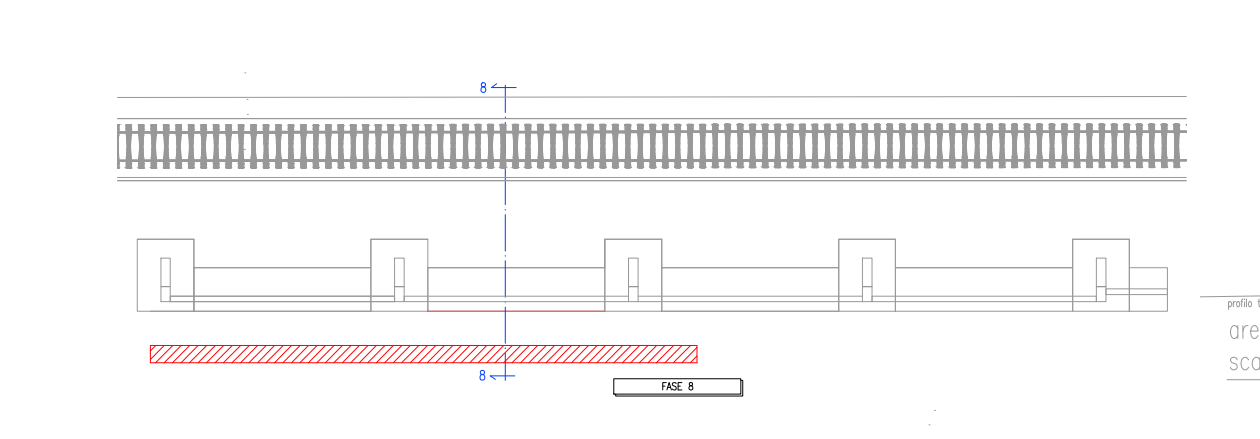



- FASE 8
- SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER FONDAZIONE CONTINUA
 - MAGRONE
 - POSA CASSERI FONDAZIONI
 - POSA ARMATURE FONDAZIONI GIA' ASSEMBLATE
 - GETTO IN C.A. FONDAZIONI
 - POSA RIPRESE PER MURI
 - REINTERRO PARZIALE

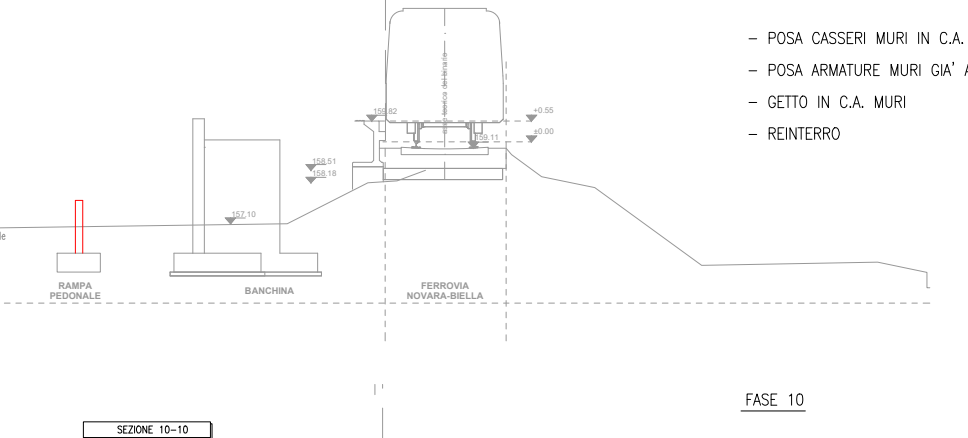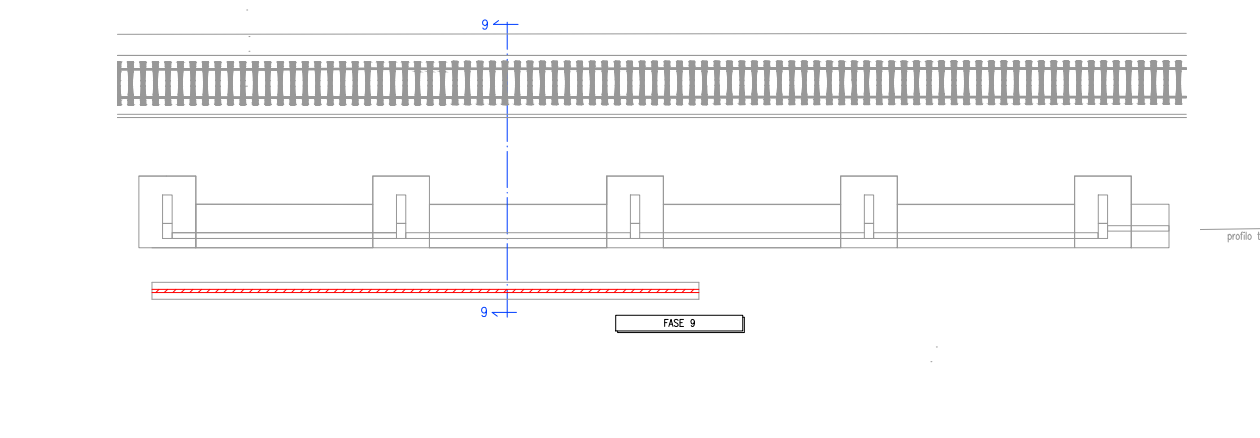



- FASE 9
- POSA CASSERI MURI IN C.A.
 - POSA ARMATURE MURI GIA' ASSEMBLATE
 - GETTO IN C.A. MURI
 - REINTERRO

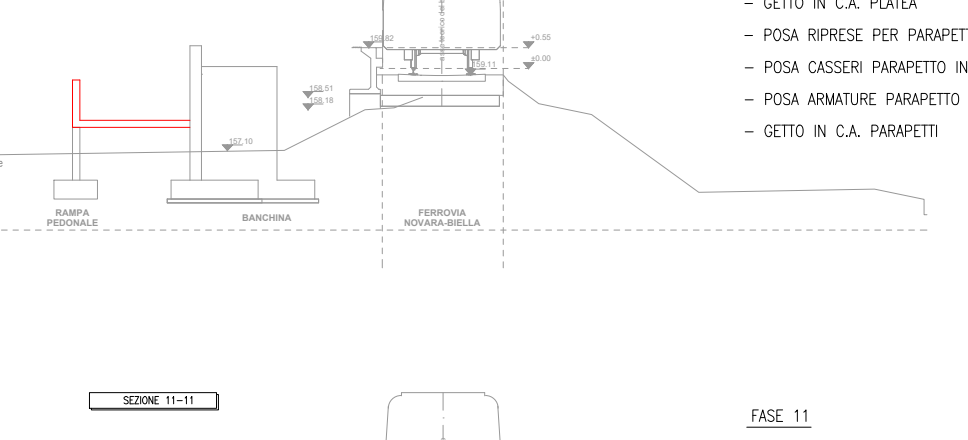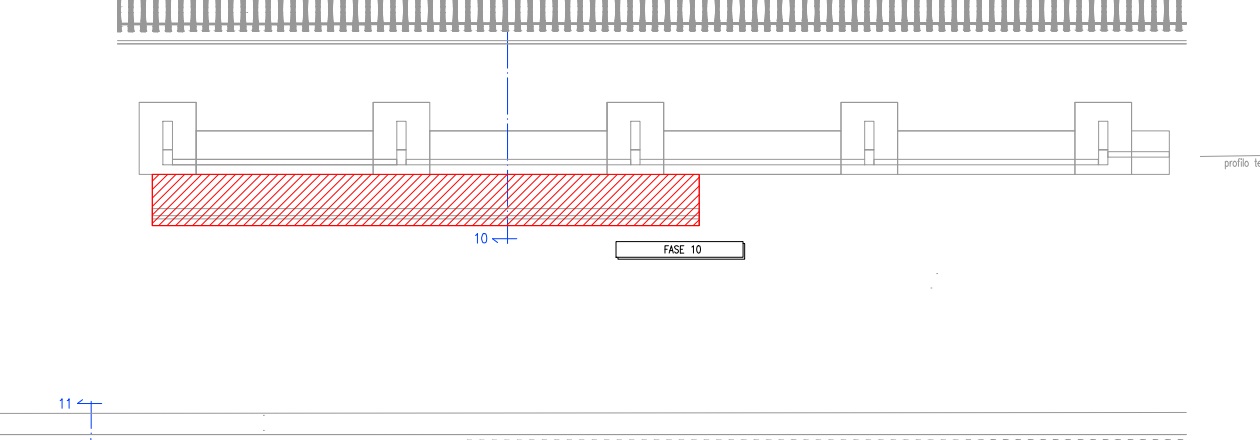



- FASE 10
- SPINATURA PLATEA IN C.A.
 - POSA CASSERI PLATEA
 - POSA ARMATURE PLATEA GIA' ASSEMBLATE
 - GETTO IN C.A. PLATEA
 - POSA RIPRESE PER PARAPETTO
 - POSA CASSERI PARAPETTO IN C.A.
 - POSA ARMATURE PARAPETTO GIA' ASSEMBLATE
 - GETTO IN C.A. PARAPETTI

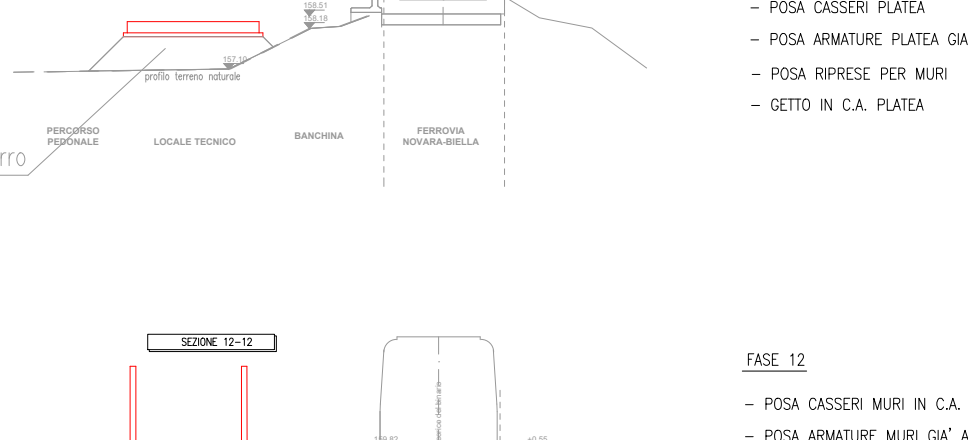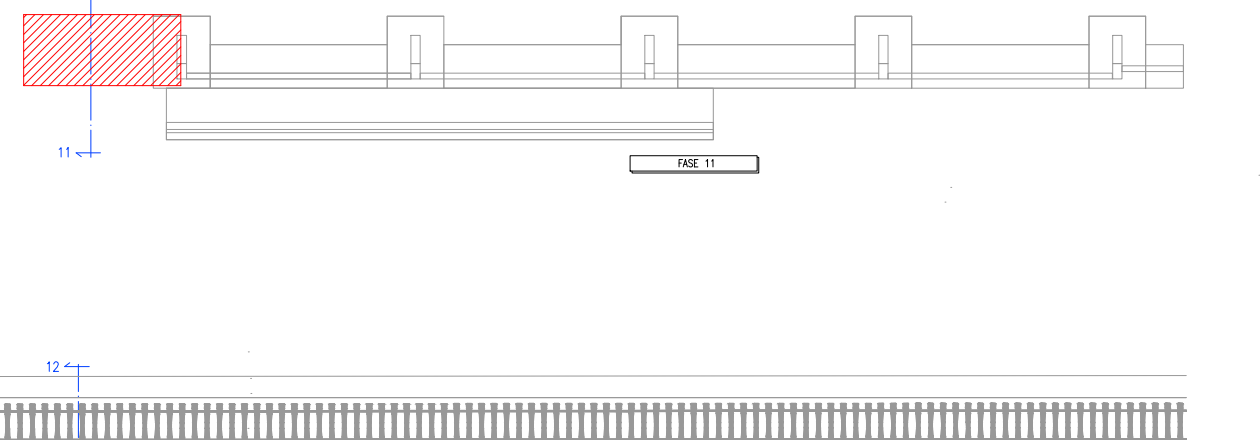


- FASE 11
- REINTERRO CON STRATO DI MISTONE CAVA GROSSA PEZZATURA ADEGUATAMENTE RULLATO PER STRATI SUCCESSIVI DI 30cm
 - MAGRONE
 - POSA CASSERI PLATEA
 - POSA ARMATURE PLATEA GIA' ASSEMBLATE
 - POSA RIPRESE PER MURI
 - GETTO IN C.A. PLATEA

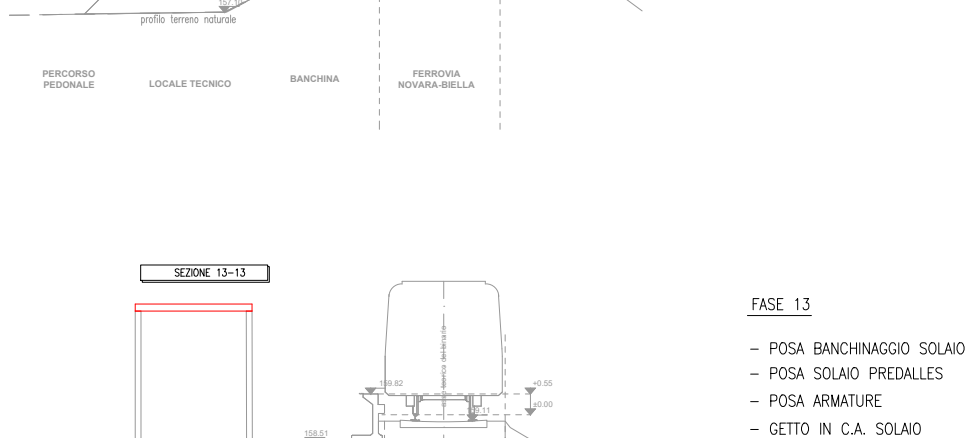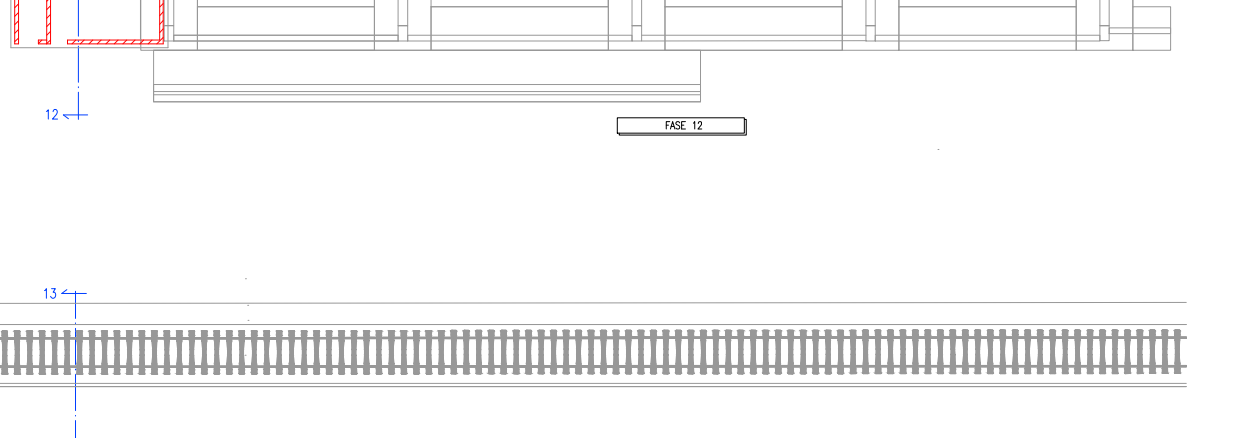

- FASE 12
- POSA CASSERI MURI IN C.A.
 - POSA ARMATURE MURI GIA' ASSEMBLATE
 - GETTO IN C.A. MURI

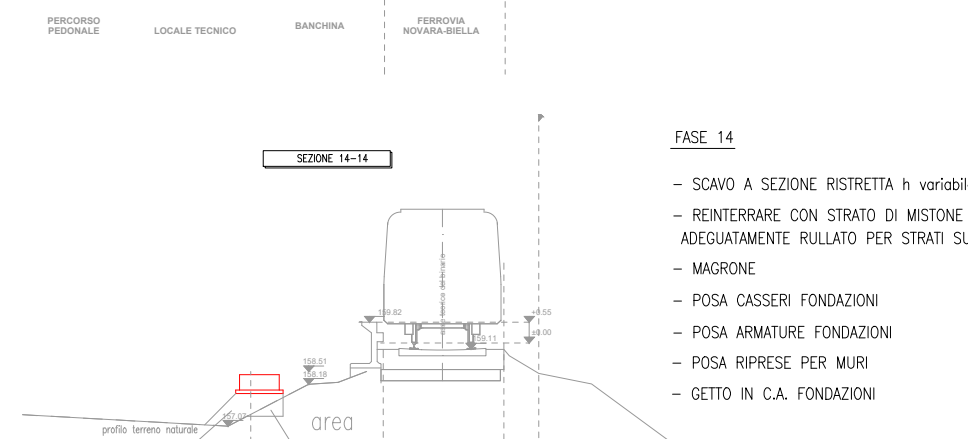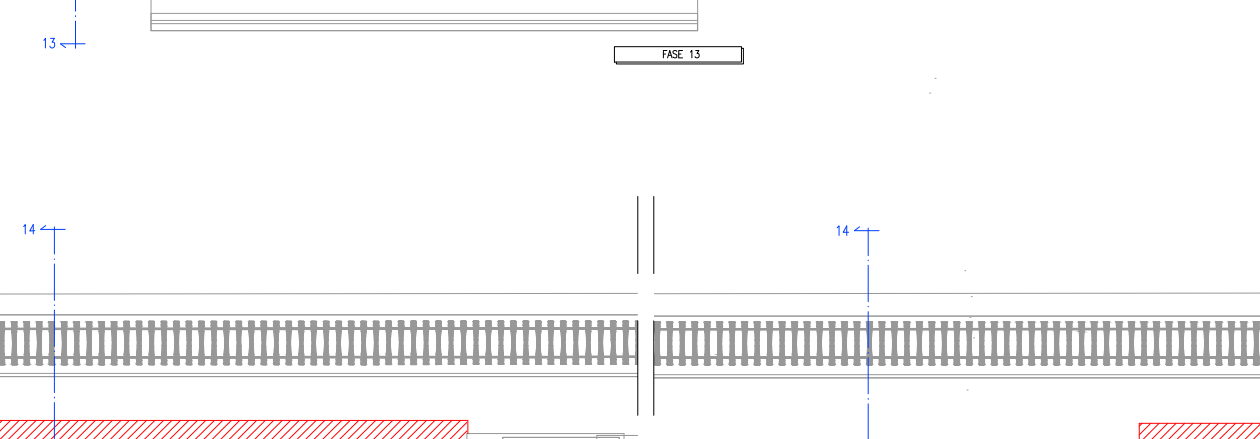

- FASE 13
- POSA BANCHINAGGIO SOLAIO PEDALLES
 - POSA SOLAIO PEDALLES
 - POSA ARMATURE
 - GETTO IN C.A. SOLAIO



- FASE 14
- SCAVO A SEZIONE RISTRETTA h variabile
 - REINTERRARE CON STRATO DI MISTONE CAVA GROSSA PEZZATURA ADEGUATAMENTE RULLATO PER STRATI SUCCESSIVI DI 30cm
 - MAGRONE
 - POSA CASSERI FONDAZIONI
 - POSA ARMATURE FONDAZIONI
 - POSA RIPRESE PER MURI
 - GETTO IN C.A. FONDAZIONI

COMUNE DI NOVARA

Nuovi interventi in Ambito T12 Agognate
Seconda Concessione - Nuova Fermata di Agognate
STRALCIO B_Nuova Fermata di Agognate
PROGETTO ESECUTIVO

S STRUTTURE
Fasi Operative
Scala

RAUM
engineering

Consulenze esterne:
Ing. A. Baschenis
Studio STIEL S.r.l.

RAUM ENGINEERING SRL
via XX settembre 38, 28100 Novara - ITALY
+39 0321 390335
P.IVA/CF 02523870034
www.raum-engineering.com

Prima stesura:
Novembre 2021

Revisione 1:

Revisione 2:

Stesura finale:

Consegna:

Es
S10
